

ABSCHLUSSBERICHT

Kinderspielplatz Traiskirchen

respekt.net Projekt-ID: 1149



PROJEKT: VOGELspielplatz - Kinderspielplatz Traiskirchen
PROJEKTINITIATIVE: Catherine Schütze, Christoph Lindner
PLANUNG: architektur2000.
FINANZIERUNG: crowdfunding über www.respekt.net; Firmenspenden
ORT: Erstaufnahmestelle Ost, Otto-Glöckel-Straße 24, 2514 Traiskirchen

Bauherr: architektur2000.
Projektleitung: architektur2000.
Bauführer: architektur2000.
Planungskoordinator: Christoph Lindner
Baustellenkoordinator: Christoph Lindner

BAUARBEITEN: Fa. Porr – Teerag Asdag

SPIELGERÄTE: Fa. Spielort, Fa. Berliner Seilfabrik Ring, Fa. HWK

FALLSCHUTZBELAG: Fa. Swietelsky

PROJEKTDATEN:

- 207m² Spielfläche
- Errichtungskosten 85.000€ (exkl. Planungsleistungen)
- Projektstart Juli 2015
- Baubeginn 13. Mai 2016
- Fertigstellung Bauphase 1: 24. Juni 2016
- voraussichtliche Fertigstellung Bauphase 2: September 2016

(ANMERKUNG Baubeginn: Aufgrund der langen Vorlaufzeiten (> 6 Wochen Lieferzeit ab Bestellung) bei einigen Spielgeräten, konnte nicht wie ursprünglich geplant im März zu bauen begonnen werden. Baubeginn war der 13.5.2016. Die ursprüngliche Projektlaufzeit, welche bei respekt.net mit einem Ende der Umsetzungsphase per 31.5.2016 angegeben war, hat sich dadurch auf Mitte August 2016 verlängert.)

WEITERFÜHRENDE LINKS UND INFORMATIONEN:

www.vogelspielplatz.com
www.facebook.com/vogelspielplatz
www.architektur2000.at

Kontakt und Rückfragen:

Christoph Lindner, Arch. DI
christoph.lindner@architektur2000.at
+43 660 84 56 0 56

Catherine Schütze, Arch. DI
catherine.schuetze@architektur2000.at

INHALT

| | |
|----------------------|-----|
| 01_Presstext | S4 |
| 02_Baubeschreibung | S8 |
| 03_Bautagebuch | S12 |
| 04_Kostenaufstellung | S47 |
| 05_Rechnungskopien | S48 |
| 06_Fotodokumentation | S65 |



Verfasser: Christoph Lindner, Arch DI

Wien, 08.09.2016

01_Presstext



Im Frühling 2016 wurde im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen ein Kinder- und Jugendspielplatz gebaut. Das Projekt „VOGELspielplatz – Kinderspielplatz Traiskirchen“ stellt, in der Gesamtheit seines Entstehungsprozesses, einen Ausdruck einer starken und leistungsfähigen Zivilgesellschaft dar.

Mit einer geringen Anzahl an geeigneten Spielgeräten und einer entsprechenden Freiflächengestaltung wird im Rahmen des Spielplatzprojektes www.vogelspielplatz.com ein zeitgemäßer Kinderspielplatz geschaffen, welcher ein lebendiges und liebevolles, ein spannendes und attraktives Spielplatzprojekt darstellt und den Kindern im Erstaufnahmezentrum zumindest stundenweise Freude bereiten und ihnen helfen kann, die Gedanken an ihren meist langen und leidvollen Weg der Flucht kurzzeitig zu vergessen.

Die unbefriedigenden humanitären Zustände im Erstaufnahmezentrum Traiskirchen im Sommer 2015 sind ausreichend bekannt. Auch wenn sich die Lage in Traiskirchen derzeit etwas entspannt hat, muss trotzdem hervorgestrichen werden, dass Kinder, die sehr wahrscheinlich traumatische Ereignisse erlebt haben, einen großen Teil ihrer Zeit ohne angemessene Beschäftigung sich selbst überlassen sind. Gespielt wurde im Sommer 2015 aus Mangel an kindgerechten Spielflächen auf dem Gehsteig, auf der Straße und in Verkehrsinseln vor dem Erstaufnahmezentrum. Das ist unzumutbar und nicht im Sinne der UN-Kinderrechtskonvention Artikel 27, Artikel 31 und des BVG über die Rechte von Kindern Artikel 1.

Das Projekt „Kinderspielplatz Traiskirchen“ ist aufgrund einer privaten Initiative von zwei jungen Architekten (Arch. DI Catherine Schütze und Arch. DI Christoph Lindner) im Sommer 2015 entstanden, zu einem Zeitpunkt, an dem die massive Überbelegung des Erstaufnahmezentrums Traiskirchen offensichtlich wurde und die daraus resultierenden Missstände, die auch viele andere Österreicherinnen und Österreicher zu privatem Engagement ermutigten, die beiden Architekten zur Planung eines Kinderspielplatzes für die unbeschäftigten und großteils unbetreuten Kinder in Traiskirchen veranlassten. Die Umsetzung des Kinderspielplatzes im Gesamtwert von ca. 100.000 Euro, welcher ausschließlich mit Geld- Sach- und Zeitspenden finanziert wurde, ist nun durch die tatkräftige und großzügige Unterstützung österreichischer Unternehmen, der Kinderfreunde und dem großartigen Engagement privater Spenderinnen und Spender auf der crowdfunding Plattform www.respekt.net möglich geworden.

Neben vielen anderen beeindruckenden gesellschaftspolitischen „Flüchtlings“-Projekten, die während des letzten Jahres entstanden sind, ist auch dieses Projekt Ausdruck für Solidarität mit Menschen in Not und Menschlichkeit im Umgang mit Krisensituationen. Denjenigen, die ihre Stimme nicht selbst erheben können – den Kindern in Traiskirchen – ist dieses Projekt gewidmet. Und es versucht, dem Ausspruch von Julius Tandler „*Wer Kindern Paläste baut, reißt Kerkermauern nieder.*“ so gut es geht, gerecht zu werden.




Das Bautagebuch mit aktuellen Fotos und Infos zur Baustelle gibt es auf:
www.facebook.com/vogelspielplatz

ENTWURF

Ein fliegender, farbenfroher Vogel dient als Grundform für das Spielplatzprojekt Traiskirchen. Durch diese starke Symbolik sollen Assoziationen mit Freiheit und Friedenstaube bei BetrachterIn und NutzerIn geweckt werden. Die Abstraktion auf klar definierte geometrische Elemente - der Vogel setzt sich ausschließlich aus Dreiecken und Rauten zusammen - lässt den beabsichtigten Eindruck eines Origamikunstwerks entstehen. Bewusst wurde das symbolträchtige, plakative Motiv des Vogels gewählt, um unmissverständlich und breitenwirksam eine architektonische und sozialpolitische Aussage zu treffen und ein Höchstmaß an Wiedererkennungswert zu schaffen.

Die Grundfläche gliedert sich in vier Bereiche, welche in den Farben Cyan, Magenta, Gelb und Weiß gehalten sind. Jede Fläche ist mit Spielgeräten ausgestattet und erfüllt unterschiedliche Funktionen.

Abseits der Spielflächen sind Sitzmöglichkeiten für Eltern oder Begleitpersonen vorgesehen. Dieses vielfältige Angebot an Betätigungsmöglichkeiten soll sozialen Zusammenhalt, Durchmischung und Kommunikation bei den AsylwerberInnen verschiedener Altersgruppen fördern. Zudem können gerade bei Jugendlichen durch sportliche Betätigung aufgestaute Aggressionen und Frustration auf sanfte und sinnvolle Art abgebaut werden.

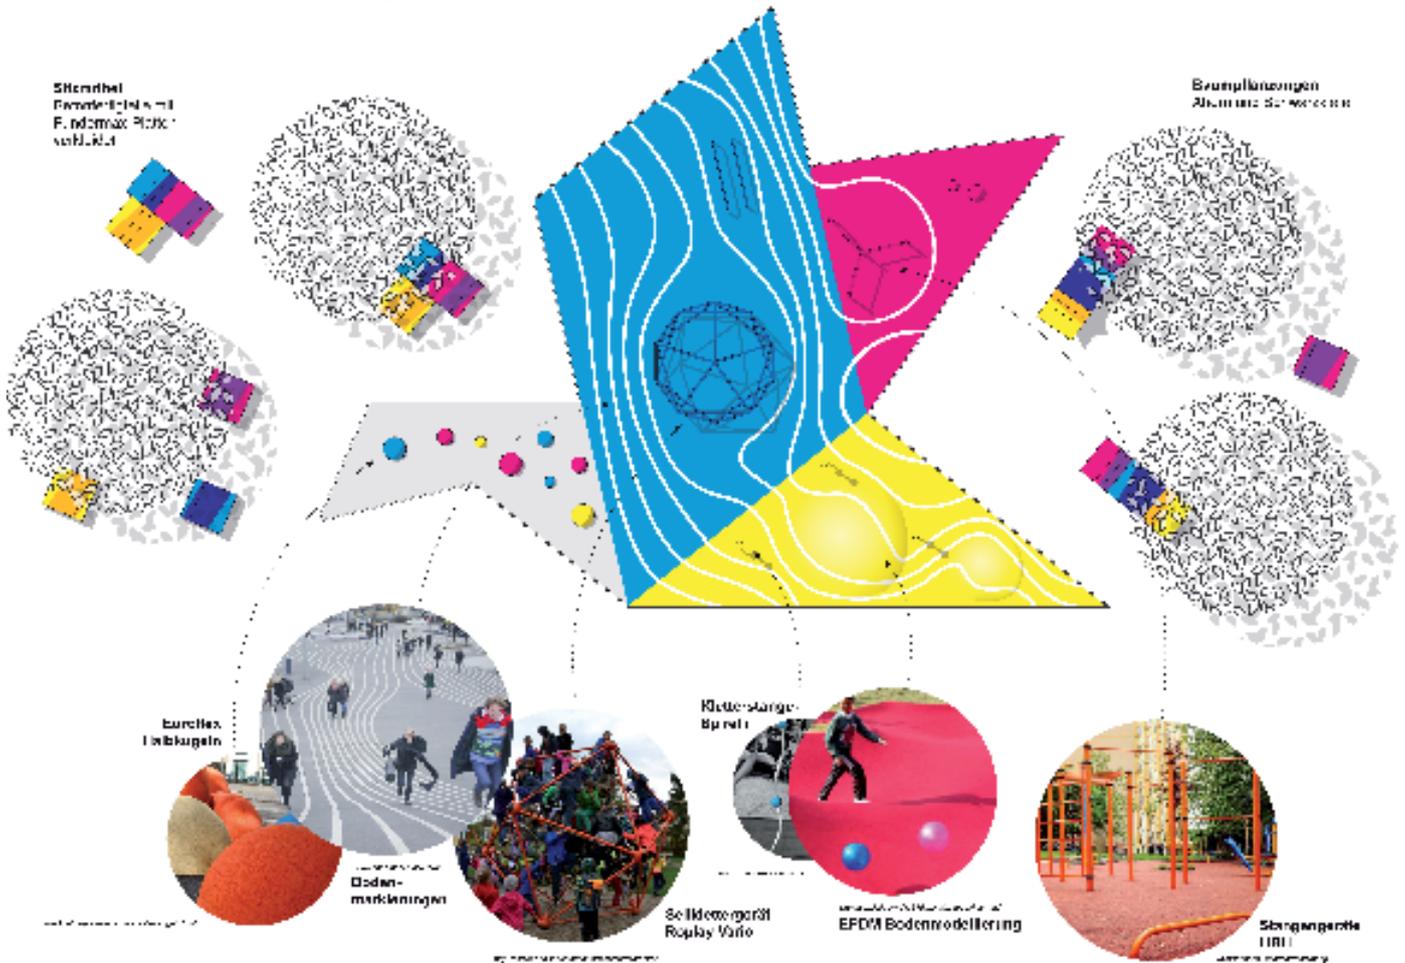

AUSBLICK

Traiskirchen stellt mit diesem Prototyp des VOGELspielplatzes einen Ausgangspunkt für ein langfristiges, österreichweites, solidarisches Spielplatzprojekt dar. Bei Bedarf kann an jedem Ort, an dem neue Flüchtlingsquartiere geschaffen werden oder der Bedarf vorhanden ist, ein VOGELspielplatz „angebaut“ werden. Durch die Symbolträchtigkeit des Vogels ist ein hoher Wiedererkennungswert gegeben und die Summe aller VOGEL Spielplätze soll vom kollektiven Gedächtnis der Öffentlichkeit als VOGELschwarm wahrgenommen werden. Das Projekt soll in seiner Gesamtheit internationale Vorbildwirkung übernehmen.

PLANUNG

ARCHITEKTUR2000. über uns.

Sämtliche Planungsleistungen werden von *architektur2000.* unentgeltlich durchgeführt.

architektur 2000. versteht sich als Planungskollektiv und wurde von der Architektin Catherine Schütze, DI und dem Architekten Christoph Lindner, DI im Herbst 2014 als freischaffendes Architekturbüro mit dem Grundsatz „Die Architektur ist durch eine konkrete Aufgabenstellung immer an einen Zweck gebunden, das „Schöne“ ist gleichzeitig und direkt stets Dienstleistung am Menschen.“ [Zitat: Margarete Schütze-Lihotzky] gegründet.

PROJEKTUNTERSTÜTZERINNEN UND SPONSOREN



BOREALIS



Spielgeräte fürs Leben



+ **70 PRIVATE SPENDERINNEN UND SPENDER** auf der crowdfunding Plattform www.respekt.net
<http://www.respekt.net/projekte-unterstuetzen/details/projekt/1149/>

KONTAKT UND RÜCKFRAGEN

Christoph Lindner, Arch. DI
christoph.lindner@architektur2000.at
+43 660 84 56 0 56
Catherine Schütze, Arch. DI
catherine.schuetze@architektur2000.at

PROJEKTDATEN

- 200m² Spielfläche + 1000m² Freiflächengestaltung
- Ort: Erstaufnahmezentrum Traiskirchen, NÖ
- Projektkosten: ca. 100.000€
- Projektstart: Juli 2015
- Baubeginn: Mai 2016
- Fertigstellung Bauphase 1: Juni 2016
- Fertigstellung Bauphase 2: Oktober 2016

WEITERFÜHRENDE LINKS UND INFORMATIONEN

www.vogelspielplatz.com
www.facebook.com/vogelspielplatz
<http://www.respekt.net/projekte-unterstuetzen/details/projekt/1257>

02_Baubeschreibung

1. PROJEKTBETEILIGTENLISTE

Projektinitiative und Koordination
Architektur2000.
Projektleitung: Frau Schütze, Herr Lindner.

Projektkontakte Erstaufnahmestelle Ost, BMI
Leiter der Erstaufnahmestelle Ost: Herr Schabhüttl

Projektbetreuung BIG: Herr Omasits

Bauarbeiten
Fa. Porr – Teerag Asdag
Projektleiter: Herr Unger
Bauleiter: Herr Salmhofer, Herr Wolf

Spielgeräte
Fa. Spielort, Fa. Berliner Seilfabrik Ring
Projektleiter, Planung: Herr Mitterhauser

Fa. HWK Spielplatz Service
Projektleiter: Herr Pfleger

Fallschutzbelag
Fa. Swietelsky
Projektleiter: Herr Schuh

Sitzmöbel (Bauphase 2)
Fa. Fundermax
Projektleiter: Herr Söchting

Fa. STS Betonfertigteile
Projektleiter: Herr Sprenger

Fa. innotec
Projektleiter: Herr Pscheidt

2. ALLGEMEINES

2.1. Bauvorhaben

Das Bauvorhaben „VOGELspielplatz – Kinderspielplatz Traiskirchen“ soll den beste-henden Kinderspielplatz in der Erstaufnahmestelle Ost (Erstaufnahmezentrum Traiskirchen) nach neuestem Stand der Technik erweitern.

2.2. Grundstück

Erstaufnahmestelle Ost
Otto-Glöckel-Straße 24, 2514 Traiskirchen

2.3. Eckdaten

| | | |
|----------------|----------------------------------|---------------------|
| Mai/Juni 2016: | BAUPHASE 1: Spielplatzfläche: | 207 m ² |
| Oktober 2016: | BAUPHASE 2: Beplante Freifläche: | 1300 m ² |

2.4. Spielplatzfläche:

BAUPHASE 1: Auf dem Gelände des Erstaufnahmezentrums Ost (Erstaufnahmezentrum Traiskirchen) soll im Hof, welcher von den Gebäuden 24, 4, 12, und 5 begrenzt wird, auf der Freifläche vor Gebäude 24 ein Kinder- und Jugendspielplatz mit 207m² Nutzfläche errichtet werden. Dieser stellt eine zeitgemäße Erweiterung des bestehenden Spielgeländes nach aktuellem Stand der Technik dar. Der Schwerpunkt liegt im Jugendspielbereich, da dies dem durchschnittlich zu erwartenden NutzerInnenprofil entspricht.

2.5. Außenanlagen

BAUPHASE 2: Auf einer Gesamtfläche von 1300 m² soll eine attraktive Freifläche mit Sitzgelegenheiten rund um den Jugendspielplatz entstehen um das Gelände zu beleben. Baumpflanzungen, vorzugsweise Ahorn und Schwarzkiefer, sorgen für die notwendige Verschattung.

2.6. Bezugsniveau

Fallschutzbelag OK = Bestandsboden OK (Rasenfläche)

3. OBJEKTBESCHREIBUNG

3.1. Allgemein

Ein fliegender, farbenfroher Vogel dient als Grundform für das Spielplatzprojekt Traiskirchen. Die Grundfläche gliedert sich in vier Bereiche, welche in den Farben Blau, Pink, Gelb und Grau gehalten sind. Jede Fläche ist mit Spielgeräten ausgestattet und erfüllt unterschiedliche Funktionen. Am Boden aufgebrachte Linien dienen als Bahnen, die zum Spielen, Laufen und Verweilen animieren. Die Linien nehmen Rücksicht auf die Bebauung, sie umfließen die Spielgeräte. Dadurch soll der Bewegungsfluss der Kinder gelenkt werden und das Spielgelände attraktiviert werden. Aufgrund der Ausstattung mit verschiedenen Arten von Spielgeräten ergeben sich Nutzungszonen für Kinder unterschiedlichen Alters.

Zone 1 (grau) ist ein Kleinkinderbereich, welcher durch Niveaumodellierung (Euroflex Halbkugeln) von Zone 2 getrennt ist, um Bewegungsflüsse zu stoppen und einen Ruhebereich für Kleinkinder herzustellen.

Zone 2 (Jugendspiel) gliedert sich in Kernbereich (blau) mit dem Seilklettergerät „Roplay Vario“ und Randbereich (gelb). Durch eine Geländemodellierung entwickelt sich im Randbereich eine spannende Topographie, welche durch Kletterstangen und Bodenmarkierungslinien vervollständigt wird.

Zone 3 (pink) stellt einen Fitnessbereich für Jugendliche mit einfachen, robusten Stangengeräten dar.

Dieses vielfältige Angebot an Spielmöglichkeiten soll sozialen Zusammenhalt, Durchmischung und Kommunikation bei den AsylwerberInnen verschiedener Altersgruppen fördern. Zudem können gerade bei Jugendlichen durch sportliche Betätigung aufgestaute Aggressionen und Frustration

auf sanfte und sinnvolle Art abgebaut werden. Abseits der Spielflächen sind attraktive Sitzmöglichkeiten für Eltern oder Begleitpersonen vorgesehen.

3.2. Bauweise und Materialien

Als Fallschutzbelag dient ein wasserdurchlässiger EPDM Bodenbelag. Die farbliche Ausgestaltung des EPDM Bodenbelags trennt die Grundform in Spielbereiche verschiedener Nutzung. Die Stärke des Belags ist abhängig von den verschiedenen maximalen Fallhöhen der unterschiedlichen Spielgeräte und wird im gesamten Bereich nach aktuellen Normen und Anforderungen (laut Angabe Fa. Swietelsky) ausgeführt.

Der Bodenbelag ist gegossen, um die einheitlichen Zonen haptisch und optisch zu betonen. Der EPDM Belag wird mit Betonrandsteinen eingefasst und der bestehende Rasenanschluss ordnungsgemäß wieder hergestellt.

Die Spielgeräte werden mit Punktfundamenten laut Herstellerangaben/Angaben Spielgerätehersteller aus Ortbeton dauerhaft im Boden verankert.

3.3. Spielgeräte

Alle Spielgeräte sind laut gültiger Norm ausgeführt. Alle Fallräume und Fallschutzbeläge entsprechen den gültigen Anforderungen laut Norm EN1176.

„Roplay Vario“ bietet einer Vielzahl an Kindern die Möglichkeit, gleichzeitig zu spielen und fördert aufgrund der Geräteeigenschaften soziale Kompetenzen, Rücksichtnahme und Verantwortungsbewusstsein. Im unbenutzten Zustand wirkt es aufgrund der Seilkonstruktion transparent und ermöglicht Durchblicke auf das umliegende Gelände.

Die Kletterstangengeräte „Spirelli“ stellen in Kombination mit einer Geländemodellierung und den „HBH-Stangengeräten“ einen wertvollen Beitrag zur Kraft- Ausdauer-Trainingsmöglichkeit mit eigenem Körpergewicht dar.

Als Trennelemente zwischen den verschiedenen Zonen kommen „Euroflex“ Halbkugeln aus EPDM, welche mit Bodenanker fixiert sind und bündig mit dem EPDM Bodenbelag abschliessen, zum Einsatz.

3.4. Baumpflanzungen (Bauphase 2)

In unmittelbarer Nähe zum Spielplatz werden Baumpflanzungen durchgeführt um eine ausreichende Verschattung zu gewährleisten. Aufgrund der positiven Eigenschaften für diese Anforderung kommen die heimischen Sorten Feld-Ahorn (*Acer campestre*) und Schwarzkiefer (*Pinus Nigra*) zum Einsatz.

3.5. Sitzmöbel (Bauphase 2)

Abseits der Spielflächen sind Sitzmöglichkeiten für Eltern oder Begleitpersonen vorgesehen. Diese werden als Sichtbetonfertigteilelement hergestellt und mit Fun-dermax-Platten im Bereich der Sitzflächen verkleidet um die haptischen und optischen Eigenschaften zu verbessern.

Die Möbel werden in Schotterbetten in unterschiedlichen, die Gemeinschaft fördernden Gruppierungen platziert.

Alle Sitzmöbel sind frostbeständig, unverrückbar und abwaschbar und entsprechen aktuellen Sicherheitsvorschriften.

03_Bautagebuch

FREITAG 13.05.2016

Wetter: stark bewölkt, 8° (7:00)

auf Baustelle: Fa. Porr | ÖBA: A2K

- 6:35 Baubeginn.
 - ÖBA Container wird aufgestellt
 - Baubesprechung
 - Einmessen und Markieren des Projekt 0-Punktes
 - Einmessen und Anzeichnen Vogeloutline
 - Einrichten Bauzaun
 - Aushub Humus (15cm)
- 13:00 Sichern der Baustelle



Abb. Einmessen 0-Punkt 13.5.2016; 07:56



Abb. Aushangpflichtige Unterlagen 17.5.2016; 7:00



Abb. Aushub 13.5.2016; 11:10



Abb. Übersicht Baustelle 13.5.2016; 11:09

DIENSTAG 17.05.2016

Wetter: bewölkt, 13° (7:00)

auf Baustelle: Fa. Porr | ÖBA: A2K

- 6:35 Baubeginn
Anlieferung WC Container
Aushub auf -50cm von OK Grasfläche
Im Bereich des Baumes neben „flying fox“ konnte keine Beschädigung der Wurzeln festgestellt werden.
Aushubmaterial: Erdreich plus vereinzelte Ziegel aus Bestandsfundamenten
Entsorgen des Aushubmaterials auf Deponie
Schottereinbringung für Drainschicht/Frostschuttschicht (25cm)
- 16:30 Sichern der Baustelle



Abb. Aushub 17.5.2016; 12:50



Abb. Aushub > 50cm 17.5.2016; 12:50



Abb. Schotter Frostschuttschicht 17.5.2016; 12:58

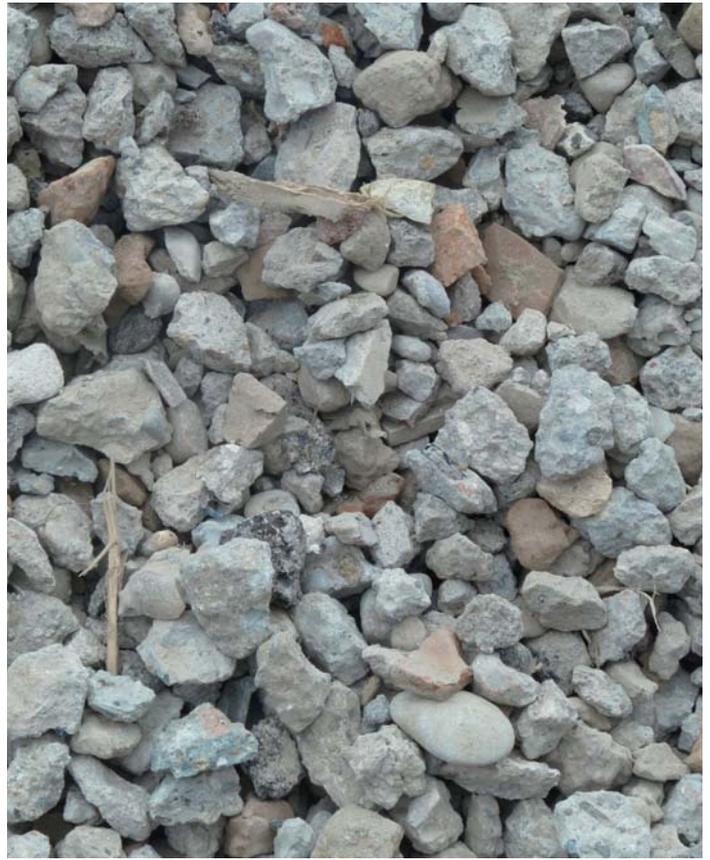


Abb. Zusammensetzung Frostschuttschicht 17.5.2016; 12:58



Abb. Aushubmaterial 17.5.2016; 09:54



Abb. Baustelleneinrichtung WC 17.5.2016; 7:00

MITTWOCH 18.05.2016

Wetter: wechselnd bewölkt, 11° (7:00)
auf Baustelle: Fa. Porr | ÖBA: A2K

- 6:35 Baubeginn
- Planieren der Frostschutzschicht auf -30cm
- Betonsteinrandeinfassung einmessen und versetzen auf 0.00 (tiefster Geländepunkt)
- Baubesprechung Fundamente
- 16:00 Sichern der Baustelle



Abb. Frostschutzschicht 18.5.2016; 14:51



Abb. OK Frostschutzschicht -30cm 18.5.2016; 14:52



Abb. Betonrandsteine 5x20cm 18.5.2016; 15:01



Abb. Betonrandsteine 5x20cm 18.5.2016; 15:00



Abb. Einbau Betonrandsteine 18.5.2016; 14:29

DONNERSTAG 19.05.2016

Wetter: bedeckt, 13° (7:00)

auf Baustelle: Fa. Porr | ÖBA: A2K

- 6:35 Baubeginn
Baubesprechung
--> Anheben des Niveaus der Randsteine um 13cm (OK neu = höchster Geländepunkt + 2cm)
Betonsteinrandeinfassung entfernen
Niveau Betonrandsteineinfassung neu einmessen und abstecken
Betonrandsteineinfassung neu versetzen
- 16:30 Sichern der Baustelle



Abb. Niveau Betonrandsteineinfassung NEU: OK = höchster Geländepunkt + 2cm 19.5.2016; 10:17

FREITAG 20.05.2016

Wetter: wechselnd bewölkt, 13° (7:00)
auf Baustelle: Fa. Porr | ÖBA: A2K

- 6:35 Baubeginn
- Betonrandsteineinfassung versetzen
- Herstellen der Fundamente (3Stck a 80x80x60cm) für Spielgerät Spirelli laut Herstellerangabe
- 12:10 Sichern der Baustelle



Abb. Schalung Fundamente Spirelli 80x80x60cm 20.5.2016; 10:57



Abb. Versetzen Betonrandsteine 20.5.2016; 10:31



Abb. Betonrandsteine OK Fundament = < -8cm 20.5.2016; 10:46



Abb. Outline Vogel 20.5.2016; 11:58

DIENSTAG 24.05.2016

Wetter: Regen, stark bewölkt, lebhafter bis starker Wind, 8° (7:00)
auf Baustelle: Fa. Porr | Fa. Berliner Seilfabrik | Fa. HBH | Fa. HWK | ÖBA: A2K

- 6:35 starker Regen
- 7:15 Baubeginn
 - Aushub Spielgerät „Vario“ laut Herstellerangabe
 - Entfernen der Schalungsplatten für Spielgerät „Spirelli“
 - Aushub und Einbau der Formrohre für Spielgeräte „HBH“
- 9:30 Anlieferung Spielgeräte durch Fa. „HBH“ und Fa. „Berliner Seilfabrik“
 - Aufbau Spielgeräte
 - Überprüfen der Fallräume / Fallhöhen (Naturmaß)
 - Einbringung Schotter
- 17:30 Sichern der Baustelle

DOKUMENTATION EINBAU SPIELGERÄTE:

- HBH: 8 Stck. Punktfundamente laut Herstellerangabe
Spielgeräte in Formrohre versetzt und mit Beton eingegossen
- SPIRELLI: Verschrauben der Fundamentplatten auf Punktfundamenten (laut Herstellerangabe)
Gewindestange mit Betonfundament in Bohrung verklebt
- VARIO: Versetzen des Spielgeräts und Überschütten der 5 Fundamentplatten mit Schotter



Abb. Punktfundamente „Spirelli“ 80x80x60cm 24.5.2016; 08:05

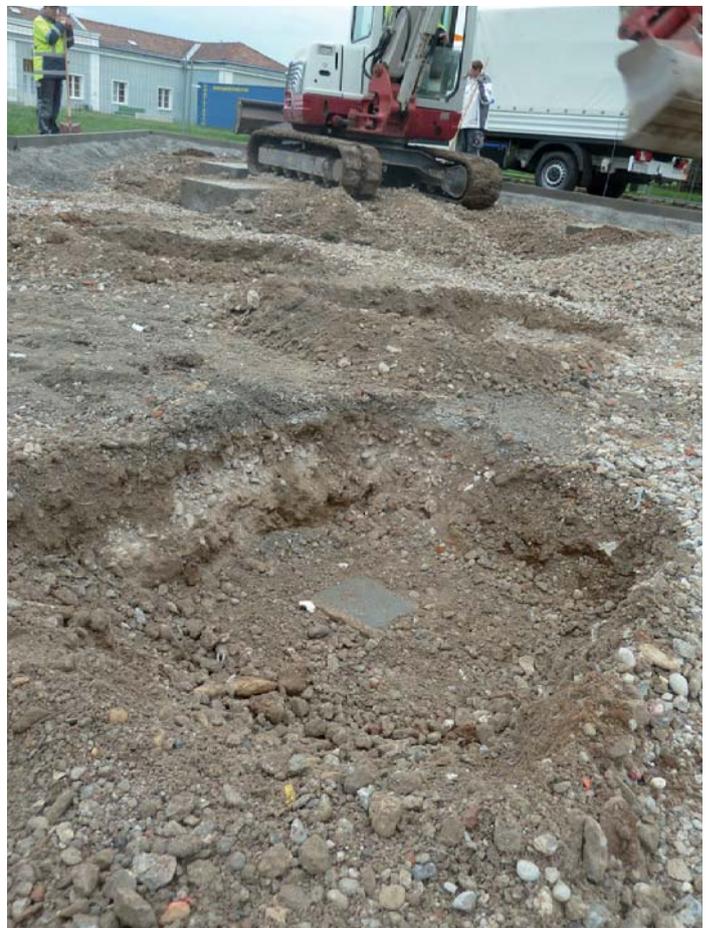


Abb. Aushub „Vario“ T = 70cm 24.5.2016; 08:10



Abb. Fundamentplatten „Vario“ 24.5.2016; 10:14



Abb. Roplay „Vario“ UK Fundamentplatte = -70cm 24.5.2016; 11:23

DIENSTAG 24.05.2016

Wetter: Regen, stark bewölkt, lebhafter bis starker Wind, 8° (7:00)



Abb. Formrohre für Fundamente „HBH“ D = 50cm; T = 70cm 24.5.2016; 11:45



Abb. Punktfundamente „HBH“ Tiefe = 70cm 24.5.2016; 13:27



Abb. Fundament „HBH“ 24.5.2016; 15:41



Abb. „HBH“ Einbaudetail Bodenanker 24.5.2016; 13:38



Abb. Einbau HBH Stangengeräte 24.5.2016; 14:44

DIENSTAG 24.05.2016

Wetter: Regen, stark bewölkt, lebhafter bis starker Wind, 8° (7:00)



Abb. Einbau „Spirelli“ 24.5.2016; 13:33



Abb. Gewindestange „Spirelli“ D = 1cm 24.5.2016; 13:35



Abb. Gewindestange „Spirelli“ L = 16cm 24.5.2016; 13:35



Abb. „Spirelli“ Einbaudetail Klebepatrone 24.5.2016; 13:37



Abb. Befestigung „Spirelli“ auf Punktfundament 24.5.2016; 13:45

DIENSTAG 24.05.2016

Wetter: Regen, stark bewölkt, lebhafter bis starker Wind, 8° (7:00)



Abb. **Bodenverdichtung** 24.5.2016; 14:14



Abb. **Einschüttung Fundamentplatten „Roplay Vario“** 24.5.2016; 15:42



Abb. OK Schotter = 8cm (unter Spielgerät „Vario“) 24.5.2016; 16:33



Abb. Spannen der Seile von Spielgerät „Vario“ 24.5.2016; 16:41

DONNERSTAG 02.06.2016

Wetter: wechselnd bewölkt, 16° (7:00)
auf Baustelle: Fa. Porr | ÖBA: A2K

- 6:35 Baubeginn
Aushub und Versatz der Fundamente für „Euroflex Halbkugeln“
Herstellung der Bodenanker für „Euroflex Halbkugeln“
Auftragen Schotterdeckschicht auf OK = -8cm bzw. OK = -4cm (grauer Bereich)
Verdichten des Schotters
Herstellen der „Hügel“ mit Ortbeton
Abfasen der spitzen Winkel der Betonrandsteineinfassung
- 15:30 Absichern der Bodenanker; Sichern der Baustelle



Abb. Punktfundamente „Euroflex Halbkugeln“ D = 30cm, T = 50cm 02.6.2016; 09:20



Abb. Formrohr Bodenanker D = 4cm 02.6.2016; 07:51



Abb. Fundament „Euroflex Halbkugel“ T = 50cm 02.6.2016; 07:55



Abb. OK Schotter = -8 cm 02.6.2016; 10:11

DONNERSTAG 02.06.2016

Wetter: wechselnd bewölkt, 16° (7:00)



Abb. Fase bei spitzen Winkeln 24.5.2016; 11:11



Abb. Bodenverdichtung 02.6.2016; 11:19



Abb. Nivellierung Boden (OK = -8 bzw. -4 02.6.2016; 13:47



Abb. OK Schotter = -8cm 02.6.2016; 13:47



Abb. OK Schotter = -8 cm 02.6.2016; 13:48

DONNERSTAG 02.06.2016

Wetter: wechselnd bewölkt, 16° (7:00)



Abb. Herstellung Bodenmodellierung mit Ortbeton 24.5.2016; 13:26



Abb. Schutzabdeckung Bodenanker 02.6.2016; 15:23

MONTAG 06.06.2016

Wetter: sonnig, 20° (7:00)

auf Baustelle: Fa. Swietelsky | ÖBA: A2K

- 8:30 Baubesprechung
- Anlieferung EPDM Rohmaterial
- Fallschutzbelag (EPDM Grundschrift: 7cm bzw. 3cm) einbringen und nivellieren auf OK = -1cm
- 17:00 Sichern der Baustelle

DIENSTAG 07.06.2016

Wetter: sonnig, 20° (7:00)

auf Baustelle: Fa. Swietelsky | ÖBA: A2K

7:00 Baubeginn

Fallschutzbelag (EPDM Grundschrift: 7cm bzw. 3cm) einbringen und nivellieren auf OK = -1cm

Fallschutzbelag (EPDM Deckschrift im Bereich „grau“ aufbringen (Stärke 1cm) --> OK = 0.0

16:00 Sichern der Baustelle



Abb. Fallschutzbelag Grundschrift schwarz, Dicke 3 bzw. 7cm 07.6.2016; 12:07

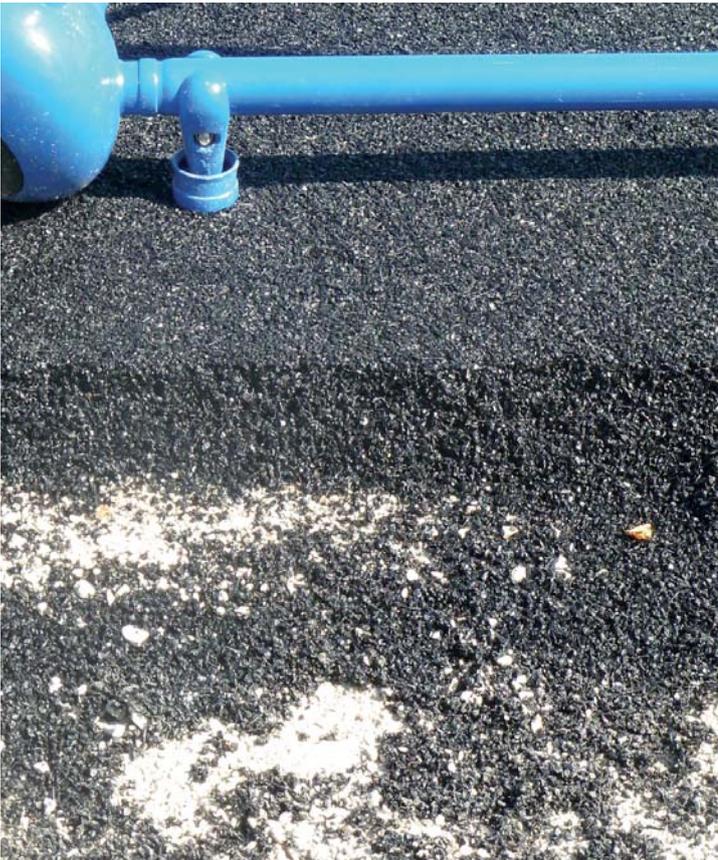


Abb. Fallschutzbelag Dicke 7cm 07.6.2016; 09:14



Abb. Fallschutzbelag Dicke 7cm 07.6.2016; 09:14



Abb. Deckschicht Fallschutzbelag grau Dicke = 3cm (schwarz) + 1cm (grau) 07.6.2016; 13:13

MITTWOCH 08.06.2016

Wetter: sonnig, 20° (7:00)

auf Baustelle: Fa. Swietelsky | ÖBA: A2K

7:00 Baubeginn

Fallschutzbelag: OK = 0.0 (EPDM Deckschicht in den Bereichen „gelb“ und „rosa“ aufbringen (Stärke 1cm))

16:00 Sichern der Baustelle



Abb. Fallschutzbelag Deckschicht M, Y, grau; Dicke 1cm OK = 0.0 08.6.2016; 14:38

DONNERSTAG 09.06.2016

Wetter: sonnig, leichter Wind, 17° (7:00)
auf Baustelle: Fa. Swietelsky | ÖBA: A2K

- 7:00 Baubeginn
 - Entfernen der Alu-Randleisten zwischen den Farbbereichen
 - Fallschutzbelag: OK = 0.0 (EPDM Deckschicht im Bereich „blau“ aufbringen (Stärke 1cm))
- 17:00 Fertigstellung Bodenbelagsarbeiten
- 17:30 Sichern der Baustelle

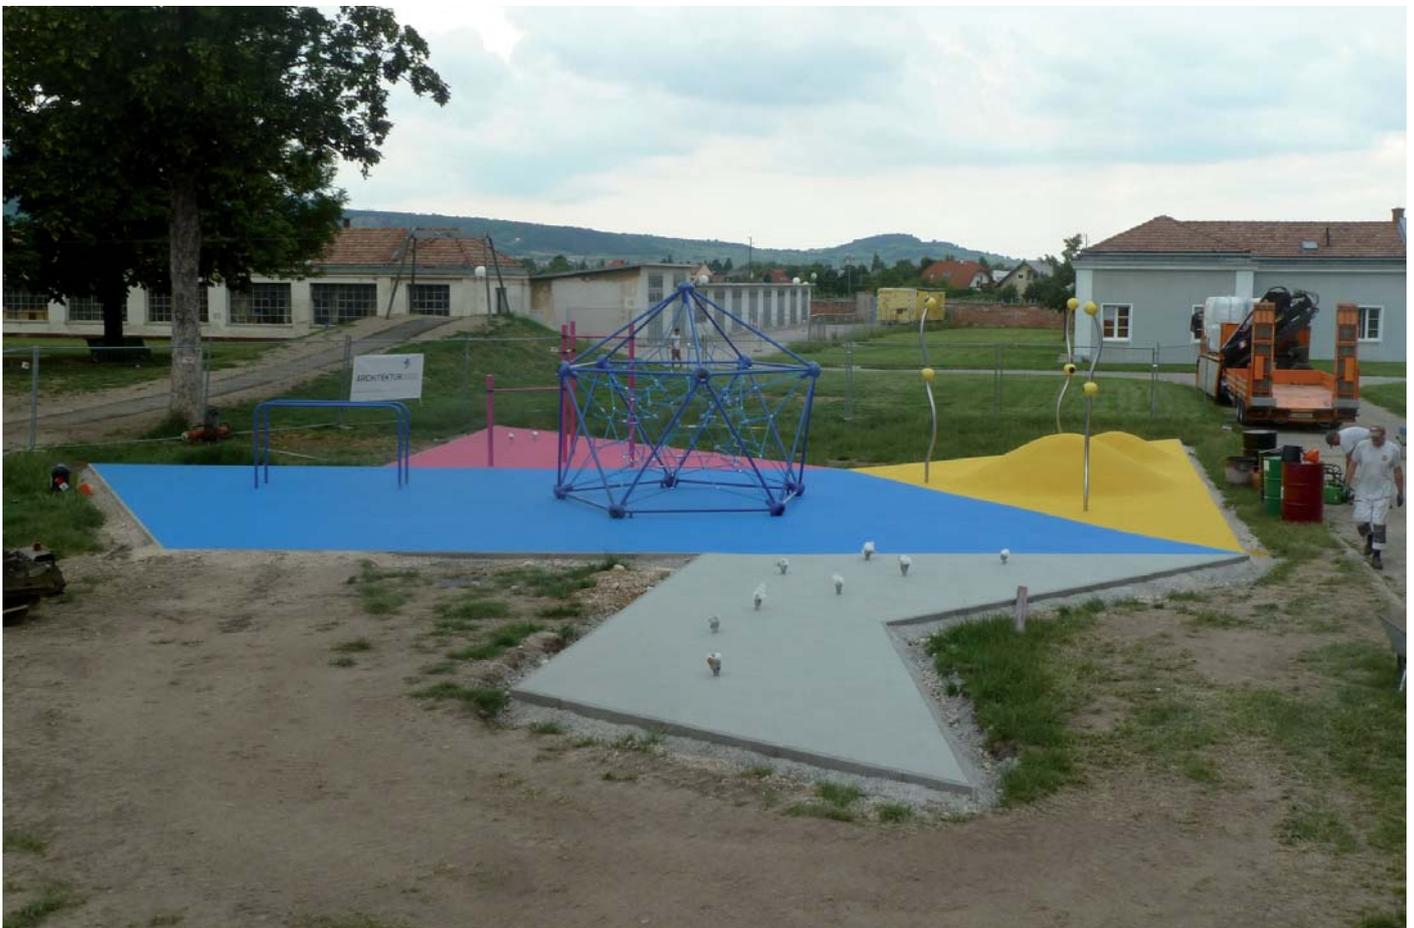


Abb. Fallschutzbelag 09.6.2016; 16:50

MONTAG 13.06.2016

Wetter: wechselnd bewölkt, 20° (7:00)

auf Baustelle: Fa. Swietelsky | ÖBA: A2K

- 6:30 Baubesprechung
- Markierungsarbeiten Bodenbelag
- 16:30 Sichern der Baustelle

DIENSTAG 14.06.2016

Wetter: wechselnd bewölkt, 18° (7:00)

auf Baustelle: Fa. Swietelsky | Fa. Spielort | ÖBA: A2K

- 6:30 Baubeginn
- Markierungsarbeiten Bodenbelag
- 16:30 Fertigstellung Bodenmarkierungen
- 16:00 Montage „Euroflex Halbkugeln“
- 18:00 Fertigstellung Spielplatzvogel.
- 18:00 Sichern der Baustelle



Abb. Produkt Linierung 14.6.2016; 11:45



Abb. Verklebung „Halbkugeln“ auf Bodenanker 07.6.2016; 16:39



Abb. Kleber „Halbkugeln“ 07.6.2016; 16:40



Abb. VOGELspielplatz. 14.6.2016; 18:02

FREITAG 17.06.2016

Wetter: wechselnd bewölkt, 17° (7:00)
auf Baustelle: TÜV Austria | ÖBA: A2K

11:45 TÜV Abnahme
bei der Begehung wurden keine offensichtlichen Mängel festgestellt.

DONNERSTAG 23.06.2016

Wetter: sonnig, 25° (7:00)

auf Baustelle: Fa. Porr | ÖBA: A2K

- 14:00 Baubeginn
Abböschungsarbeiten
- 17:00 Sichern der Baustelle



Abb. Abböschungsarbeiten 23.6.2016; 15:28

FREITAG 24.06.2016

Wetter: sonnig, 25° (7:00)

auf Baustelle: Fa. Porr | ÖBA: A2K

6:30 Baubeginn
Abböschungsarbeiten / Humusierung (Steine (D>5cm) wurden entfernt)
Entfernung Baucontainer

11:00 FERTIGSTELLUNG BAUPHASE 1



Abb. Abböschungsarbeiten 24.6.2016; 08:56



Abb. Deckschicht 24.6.2016; 12:38

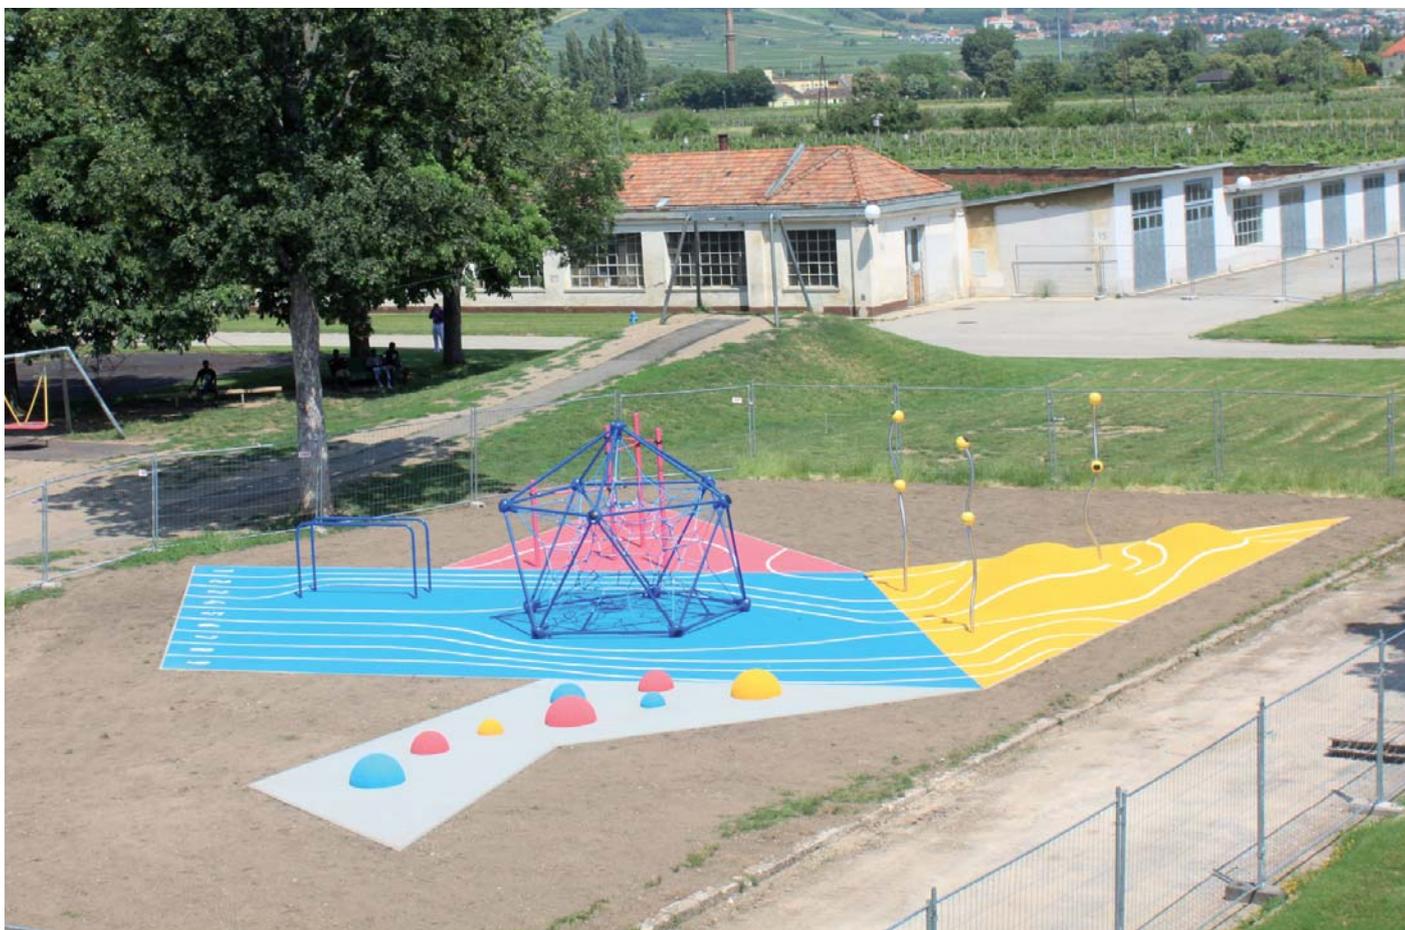


Abb. VOGELspielplatz. 24.6.2016; 12:36

04_Kostenaufstellung

KOSTENAUFSTELLUNG Kinderspielplatz Traiskirchen Bauphase1 (Spielplatz)

EINNAHMEN:

| Pos | Finanzierung | Betrag | Art |
|--------------|---------------|--------------------|---------------|
| 1 | respekt.net | 35,120.00 € | crowdfunding |
| 2 | Firmenspenden | 17,030.00 € | Firmenspenden |
| SUMME | | 52,150.00 € | |

AUSGABEN:

| Pos | Fa. | Datum | Betrag brutto | Leistung | Anmerkung |
|--------------|---------------------|------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1 | printpool | 07.12.2015 | 90.00 € | Drucksorten | |
| 2 | Obi | 03.03.2016 | 87.34 € | Hilfsmaterialien | |
| 3 | Hornbach | 18.03.2016 | 16.88 € | Hilfsmaterialien | |
| 4 | Berliner Seilfabrik | 25.05.2016 | 9,073.80 € | Spielgeräte | |
| 5 | HWK | 13.06.2016 | 816.48 € | Spielgeräte Montage | |
| 6 | Spielort | 20.06.2016 | 1,836.89 € | Spielgeräte | 2%Skonto |
| 7 | Obi | 20.06.2016 | 59.77 € | Hilfsmaterialien | |
| 8 | Obi | 23.06.2016 | 79.99 € | Hilfsmaterialien | |
| 9 | Swietelsky | 28.06.2016 | 30,801.50 € | Fallschutzbelag | 3%Skonto |
| 10 | Fahrtkosten | 30.06.2016 | 408.24 € | Fahrtkosten | |
| 11 | Teerag Asdag | 09.08.2016 | 3,594.68 € | Bauarbeiten | |
| 12 | TUV | 09.08.2016 | 118.80 € | TUV Abnahme | |
| SUMME | | | 46,984.37 € | | |

Einnahmen - Ausgaben = **5,165.63 € ***

* Dieser Differenzbetrag wird in Bauphase2 (Herbst 2016) für Sitzmöbel und Verschattung herangezogen.
aktueller Projektstand siehe: www.vogelspielplatz.com

Ich - Christoph Lindner - bestätige die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und projektbezogene Verwendung sämtlicher oben angeführten Beträge.



05_Rechnungen

bezahlt 20.06.2016/

1
geprüft: CL

C. Jäger, Burggasse 76/43, 1070 Wien

Christoph Lindner
Hummelgasse 6/6
1130 wien



Rechnung Nummer 12/15/ 18810

Datum 07.12.15

Wir danken für Ihren Auftrag und verrechnen laut Offert:

1.000 Stk. Postkarte, Vogelspielplatz, A6, 265g Postkartenkarton,
4/4-fbg., auf Format schneiden, einseitig uv-lackieren.

| | |
|---------------------|----------------|
| Preis netto | 75,00 € |
| MWSt. 20% | 15,00 € |
| Preis gesamt | 90.00 € |

Bei Überweisung mit Telebanking bitte die Rechnungsnummer angeben – Danke.

BIC "GIBAAATWW" IBAN "AT842011130032215309"

Zahlbar innerhalb von 14 Tagen | HG Wien | UID Nr. ATU 54211507

Burggasse 76/43 | 1070 Wien | Tel.: +43/699/177 468 37 | Fax: +43/1/231 00 41 | office@printpool.at | www.printpool.at | Erste Bank | BLZ 20111 | Kto. 300 322 153 09 | UID Nr. ATU 54211507



2
geprüft: CL

Bon-ID
01004901601893980249



OBI Bau- und Heimwerkermärkte System-
zentrale GmbH, Filiale Wien St.Marx
Litfaßstrasse 8
A - 1030 Wien
Tel.: 01 907 3515
Fax.: 01 907 3515 9901
E-Mail: markta049@obi.at

Öffnungszeiten: Mo-Fr 07:30 bis 19:30Uhr
Sa 07:30 bis 18:00 Uhr

Lieferdatum = Kassendatum

01049 01 5034 0083 03.03.2016 13:20:54

Kunde Kundennummer
..... 9000
A-0000

| | | | |
|---------------|-----------------------|-------|--|
| 4005087057080 | Bastelsperrholz | | |
| 6 ST a | 6,79 B | 40,74 | |
| 4007875218208 | Universalsaege | | |
| 5 ST a | 5,79 B | 28,95 | |
| 4007817142059 | Noris ClubFarbstifte | | |
| 3 ST a | 2,79 B | 8,37 | |
| 0038372011645 | SimplyPinsetset | | |
| 1 ST | B | 6,79 | |
| 4002420706001 | Dianthus caryophyllus | | |
| 1 ST | B | 2,49 | |

Endsumme in € **87,34**

| | |
|--------------------------|----------|
| maestro | 87,34 |
| maestro Zahlung erfolgt! | |
| Terminal-ID | 60960501 |
| POS-Nr 113325 Bnr 1984 | |
| PAN: #####68991 | |
| AID-Parameter | 101587 |
| AID | |

| | | |
|------------------------------|-------|-------|
| Die Endsumme enthält an MwSt | | |
| 13,00 % MwSt D | 2,20 | 0,29 |
| 20,00 % MwSt B | 70,71 | 14,14 |

USt-IdNr.: ATU39090504

* Artikel nicht rabattfähig

Vielen Dank für Ihren Einkauf!

Umtausch original verpackter Ware nur
mit Kassenschein innerhalb von 3 Monaten.
Vom Umtausch ausgeschlossen: Lebend-,
Zuschneideware und Sonderbestellungen

Jetzt zum OBI Newsletter anmelden und
Vorteile unter www.obi.at sichern!

Auf Wiedersehen in Ihrem OBI Markt!

Beste Kundenkarte mit bestem Service
www.obi.at
OBI - Der Lieblingsmarkt der
Selbermacher

Rechnungs-Nr.: 015034

Bon-Nr: 5034
Kasse: 01
Bediener: 83

Kundennummer: 9000
Kunden-Tel:
Kunden-Fax:
Kunden-Mobil-Tel:
Kunden-Ident-Nr.:
Erstelldatum: 03.03.2016
Verkaufsdatum: 03.03.2016
UstIdNr: ATU39090504

Rechnung / Quittung

Original

Gültig nur mit Originalbon.

| | MwSt | Menge | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|-------------------|------|---------|-------------|-------------|
| | | VKE | € | € |
| | 2 | 6,000 | 6,79 | 40,74 |
| | | ST | | |
| | 2 | 5,000 | 5,79 | 28,95 |
| | | ST | | |
| | 2 | 3,000 | 2,79 | 8,37 |
| | | ST | | |
| | 2 | 1,000 | 6,79 | 6,79 |
| | | ST | | |
| us | 4 | * 1,000 | 2,49 | 2,49 |
| | | ST | | |
| Zwischensumme: | | | | 87,34 |
| Gesamtsumme: | | | | 87,34 |
| Gesamtsumme MwSt: | | | | 14,43 |

| Netto | MwSt-Betrag | Brutto |
|-------|-------------|--------|
| € | € | € |
| 2,20 | 0,29 | 2,49 |
| 70,71 | 14,14 | 84,85 |

| Zahlungsmittel | Wert |
|---------------------|-------|
| Debit-Kartenzahlung | 0,00 |
| Debit-Kartenzahlung | 87,34 |

Telefon +43 1 907 3515-0
Telefax +43 1 907 3515 9903
Paul, Yvonne

Banken
UniCredit Bank Austria AG
BLZ: 12000
Konto: 60213485313
IBAN: AT40 1200 0602 1346
5313
BIC: BKAUATWW

Seite 1 von 1
Druckdatum: 03.03.2016
gedruckt von:

#3
geprüft: CL



Hornbach Baumarkt GmbH
Filiale 680
Johann-Steinböck-Str. 7 a
A-2345 Brunn am Gebirge
Tel. +43 (0) 2236 306-0
www.hornbach.at
UID: ATU40181209

MARKT : A-2345 Brunn am Gebirg
Johann-Steinböck-Str
UID : ATU40181209
DATUM : 18.03.2016 14:04
KARTEN-NR :
RECHNUNGS-NR : 0008/000006/5154
SERVICE-TEL : +43 (0) 2236 306-0

ART/EAN 4001438007674
2 Stück x 2,45
SCHULMALPINSSEL HOLZ 4,90 1

ART/EAN 4015504031517
2 Pack x 5,99
SPERRHOLZ-PAPPEL DIN 11,98 1

Summe [2] EUR 16,88
GEGEBEN ec-Karte (D) EUR 16,88

| Artikel-Nummer | Menge/Einheit | Einzelpreis in EUR | Gesamtpreis in EUR | MwSt Nr. |
|---|---------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
| SCHULMALPINSSEL HOLZ 4001438007674 | 2 Stück | 2,45 | 4,90 | 1 |
| SPERRHOLZ-PAPPEL DIN A3 297x420x4MM 5STK/PAK 4015504031517 | 2 Pack | 5,99 | 11,98 | 1 |
| SUNME | | | EUR 16,88 | |
| GEGEBEN ec-Karte (Debitk) | | | EUR 16,88 | |
| BRUTTO | | MWST | NETTO | |
| 1 20% | 16,88 | 2,81 | 14,07 | |

BRUTTO MWST NETTO
1 20% 16,88 2,81 14,07



Es bediente Sie:
D. Fräsineanu

1 App! 1.000 Projekte.
Jetzt die neue HORNbach App
downloaden!

Dient als Steuerbeleg für ihr Finanzamt.
Wichtig! Beleg bitte aufbewahren.
Diese Rechnung ist nur in Verbindung
mit dem ansehefteten Kassensbon gültig.
>> Datum = Liefer- und Rechnungsdatum <<

>> Datum = Liefer- und Rechnungsdatum <<
0680 18.03.2016 14:04 0008 000006 005154

Sitz:
Hornbach Baumarkt GmbH
IZ NÖ-Süd, Str.3, Obj.64.
A-2355 Wiener Neudorf

Firmenbuchgericht:
Landesgericht
Wiener Neustadt
FN 135514 k
ATU 401 81 209

Bank Austria
BLZ 20151
Konto 405 128 703

bezahlt: 09.06.2016 ✓



**BERLINER
SEILFABRIK
RING**

#4
geprüft:
CL

Berliner Seilfabrik Ring
Austria GmbH
Leonsteiner Straße 21
4592 Leonstein
www.berliner-seilfabrik.at

Tel. +43. (0)7584 40071
Fax +43. (0)7584 40071-25
info@berliner-seilfabrik.at

DI Christoph Lindner
Hummelgasse 6/6
1130 Wien

Rechnung

Rechnungsnummer R000942
Kundennummer 200357
Vertreter 2

Datum 25. Mai 2016
Seite 1

Lief. an Adresse:

Erstaufnahmezentrum Ost
Kinderspielplatz
Otto-Glöckel-Straße 24
2514 Traiskirchen

Ihr Auftrag : PER E-MAIL
vom : 30.03.16
durch :
Bauvorhaben : Traiskirchen, Kinderspielplatz
Projektnr. : P00645

| Nr. | Beschreibung | Menge | Einheit | VK-Preis | Rabatt % | EUR Betrag |
|---------------------|---|--------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|
| 7030013500000 | Roplay Vario M Größe: LxBxH: 390 x 372 x 320 cm Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: 770 x 770 cm max. Fallhöhe: 210 cm empfohlenes Spielalter: ab 5 Jahren Farbe der Rohre: RAL 5010 enzianblau Farbe der Kugeln: RAL 5010 enzianblau Farbe der Seile: blau Ausführung lt. Produktdatenblatt | 1 | Stück | 7.736,00 | 50% | 3.868,00 |
| UDB260401 | SPIRELLI.01 Größe: LxBxH: 30 x 30 x 280 cm Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: 330 x 330 cm max. Fallhöhe: 150 cm empfohlenes Spielalter: ab 5 Jahren Farbe der Kugeln: RAL 1018 zinkgelb | 3 | Stück | 1.286,00 | 25% | 2.893,50 |
| 100140 * | Street Workout HBH Set 001 Größe: LxBxH: 430 x 260 x 230 cm Platzbedarf inkl. Sicherheitsbereich: 800 x 600 cm 4 Elementen-Park bestehend aus: - 1 Stk. parallel Barren HBH Bar 004 in RAL 5010 enzianblau - 3 Stk. Klimmzugstangen in verschiedenen Höhen in RAL 4010 telemagenta Alle Stahlelement sandgestrahlt und 2 x pulver- | 1 | Stück | 400,00 | 100% | 400,00 |
| | weiter auf Seite 2 | | | | | Fortsetzung 7.161,50 |

Listenpreis:
3723,0 € (Netto
inkl. Montage)
= 4467,84 € (Brutto)

*Position gestrichen laut
Telefonat vom 2.6.16
(Herr Lindner, Herr Straßmayr)

FN371651x
Steuernummer 196/0791-21
ATU66878417

Bankverbindung: Raiffeisenbank Molln-Leonstein
Konto-Nr. 38539, BLZ 34321
IBAN: AT48 3432 1000 0003 8539, BIC-Swift: RZ00AT2L321



**BERLINER
SEILFABRIK
RING**

Berliner Seilfabrik Ring
Austria GmbH
Leonsteiner Straße 21
4592 Leonstein
www.berliner-seilfabrik.at

Tel. +43. (0)7584 40071
Fax +43. (0)7584 40071-25
info@berliner-seilfabrik.at

DI Christoph Lindner
Hummelgasse 6/6
1130 Wien

Rechnung

Rechnungsnummer R000942
Kundennummer 200357
Vertreter 2

Datum 25. Mai 2016
Seite 2

Lief. an Adresse:

Erstaufnahmezentrum Ost
Kinderspielplatz
Otto-Glöckel-Straße 24
2514 Traiskirchen

Ihr Auftrag :
vom : 30.03.16
durch :
Bauvorhaben : Traiskirchen, Kinderspielplatz
Projektnr. : P00645

| Nr. | Beschreibung | Menge | Einheit | VK-Preis | Rabatt % | EUR Betrag |
|-----|--------------|-------|---------|----------|----------|------------|
|-----|--------------|-------|---------|----------|----------|------------|

Fortsetzung. 7.161,50

beschichtet

Montageleitung inkl. sämtlicher Frachtko
1 Fachmonteur unserer Firma
Bauseitige Leistungen:
2 Helfer Firma HWK, Fallschutz, sowie
Aushub der Sicherheitsbereiche, Erdarbeiten

1 Mal 800,00 800,00

**Alle angeführten Preise sind Sonder-
nettopreise bzw. einmalige Sonderrabatte!**

| | | | | |
|-------------------|------------------------|------------------------|---------|---------------------|
| Zahlungsbedingung | 10 Tage netto | Nettosumme | 7.561,5 | 7.961,50 |
| Lieferbedingung | mit Montage frachtfrei | 20% USt. | 1.512,8 | 1.592,30 |
| Versanddatum | 24.05.16 | Gesamtsumme EUR | 9.073,8 | 9.553,80 |

Berliner Seilfabrik Ring Austria GmbH

FN371651x
Steuernummer 196/0791-21
ATU66878417

Bankverbindung: Raiffeisenbank Molln-Leonstein
Konto-Nr. 38539, BLZ 34321
IBAN: AT48 3432 1000 0003 8539, BIC-Swift: RZ00AT2L321

bezahlt: 20.06.2016 ✓

5
geprüft:
CL



HWK

SPIELPLATZ SERVICE

HWK Spielplatzservice GmbH - 2100 Korneuburg, Industriezeile 10

Herr
Christoph Lindner
Architektur 2000
Hummelgasse 6
1130 Wien

Rechnung Nr.: 201640477
Kunden Nr.: 10907
Rechnungsdatum: 14.06.2016
Lieferscheindatum: 13.06.2016
Unsere Ust-IdNr.: ATU65960409

Rechnung Projekt Traiskirchen

Sehr geehrter Herr Lindner,

wir berechnen Ihnen hiermit gemäß Ihrer Bestellung wie folgt:

| Artikelnr | Bezeichnung | Einh. | Menge | Einzelpreis | G-Preis € | St. |
|-----------|---|-------|-------|--------------------------|---------------------|---------------|
| PART | Montagehilfe für Spielgeräteaufbau in Traiskirchen - Flüchtlingslager | Std | 12,15 | 112,00 | 1.360,80 | 1 |
| | | | | Summe in €: | 1.360,80 | 680,4 |
| | | | | MwSt. 20% zzgl. | 272,16 | 136,08 |
| | | | | Rechnungsbetrag € | 1.632,96 | 816,48 |


Zahlbar innerhalb 14 Tagen bis zum 28.06.2016 ohne Abzüge

Zahlweise: Rechnung

Die Ware bzw. die Leistungen bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum. Allfälliger Zahlungsabzug wird lediglich laut Angebot oder ausdrücklicher Zusage akzeptiert.

* 50% Nachlass da
karitatives Projekt;

Telefonat: Herr Pfeiffer,
Herr Lindner vom
20.6.2016, 1340

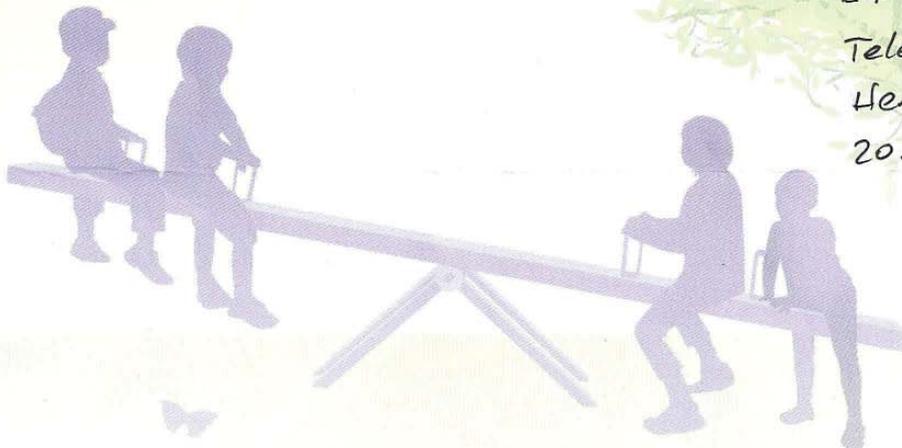

HWK Spielplatzservice GmbH, Industriezeile 10, 2100 Korneuburg, Tel.: +43 (0)2262/61318, Fax: +43 (0)2262/62857
e-mail: info@hwkspiel.at; Internet: www.hwkspiel.at
Firmenbuch: LG Korneuburg FN 352604k Sparkasse Korneuburg BIC SSKOAT21XXX Iban: AT31 2022 7000 0001 0181

bezahlt: 22.6.2016 ✓

6
geprüft: CL



Fa. Spielort

Zwln. d. Langenwalter Spiel und Sport GmbH

Projekt: Kinderspielplatz Traiskirchen
Dipl.-Ing. Christoph Lindner
Hummelgasse 6/6
1130 Wien

Kontakt:

Fa. Spielort
4055 Pucking, Hofgasse 5
Tel.: 07229/79496-0 FAX: 07229/79496-44
office@spielort.at
UID-Nr.: ATU66210469

Datum: 20.06.2016
Rechnungs-Nr.: 2016062001
Kunden-Nr.: 11377
Sachbearbeiter/-in: Gertraud Gallner

Rechnung

Sehr geehrte Damen und Herren,

gemäß Ihrer Bestellung und unserer Auftragsbestätigung vom 06.04.2016 erlauben wir uns, wie folgt Rechnung zu stellen über das Liefern von:

| Pos. | Anzahl | Einheit | Artikelnr. | Bezeichnung | Listenpreis | Rabatt | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|------|--------|---------|------------|--|-------------|--------|-------------|-------------|
| 1 | 1 | Stk. | 64395510 | Euroflex EPDM-Halbkugel, o. Bodenanker, DM: 345 mm, Farbe: l-blau RAL 5012 | € 148,00 | 50% | € 74,00 | € 74,00 |
| 2 | 1 | Stk. | 64395509 | Euroflex EPDM-Halbkugel o. Bodenanker, DM: 345 mm, Farbe: l-gelb RAL 1012 | € 148,00 | 50% | € 74,00 | € 74,00 |
| 3 | 1 | Stk. | 06560538 | Euroflex EPDM-Halbkugel o. Bodenanker, DM: 345 mm, Farbe: pink - RAL 4003 | € 148,00 | 50% | € 74,00 | € 74,00 |
| 4 | 3 | Stk. | 06560537 | Euroflex EPDM-Halbkugel o. Bodenanker, DM: 500 mm, Farbe: pink - RAL 4003 | € 295,28 | 50% | € 147,64 | € 442,92 |
| 5 | 1 | Stk. | 64394510 | Euroflex EPDM-Halbkugel o. Bodenanker, DM: 500 mm, Farbe: l-blau RAL 5012 | € 295,28 | 50% | € 147,64 | € 147,64 |
| 6 | 1 | Stk. | 64394510 | Euroflex EPDM-Halbkugel o. Bodenanker, DM: 695 mm, Farbe: l-blau RAL 5012 | € 388,67 | 50% | € 194,34 | € 194,34 |
| 7 | 1 | Stk. | 64396509 | Euroflex EPDM-Halbkugel o. Bodenanker, DM: 695 mm, Farbe: l-gelb RAL 1012 | € 388,67 | 50% | € 194,34 | € 194,34 |

Übertrag

€ 1.201,24

Fa. Spielort - Spielplatz- Sport- und Freizeiteinrichtungen
Zwln. d. Langenwalter Spiel u. Sport GmbH
Hofgasse 5, 4055 Pucking

office@spielort.at - www.spielort.at
Dienstgeberr.: 201808853
ANKO-Zertifikatnummer: 57925

Bankverbindung:
BLZ: 20326
KTO: 27706
BIC: SPNKAT21XXX
IBAN: AT432032600000027706



| Pos. | Anzahl | Einheit | Artikelnr. | Bezeichnung | Listenpreis | Rabatt | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|---|--------|---------|------------|--|-------------|--------|-------------|-------------------|
| Übertrag | | | | | | | | € 1.201,24 |
| 8 | 1 | Stk. | 06566217 | Euroflex EPDM-Halbkuigel o. Bodenanker, DM: 695 mm, Farbe: pink - RAL 4003 | € 388,67 | 50% | € 194,34 | € 194,34 |
| 9 | 10 | Stk. | 06312100 | Bodenanker für Euroflex-Kugel, Rohr 1 1/4", l=75cm | € 33,28 | 50% | € 16,64 | € 166,40 |
| Summe | | | | | | | | € 1.561,98 |
| Mehrwertsteuer 20% auf € 1.561,98 netto | | | | | | | | € 312,40 |
| Gesamtbetrag | | | | | | | | € 1.874,38 |

Zahlung: 14 Tage 2% Skonto Zahlungsbetrag € 1.836,89 bis zum 04.07.2016 oder 30 Tage netto

Lieferung und Montage: KW24

Eigentumsvorbehalt: Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der Firma Spielort. Bitte beachten Sie unsere AGBs unter www.spielort.at.
Kosten für die Wiederherstellung der Rasenflächen sind nicht enthalten!

Vielen Dank für Ihre Bestellung!

OBI®

7
geprüft: CL

OBI Markt 049 St. Marx

Bon-ID
01004901609988308473



OBI Bau- und Heimwerkermärkte System-
zentrale GmbH, Filiale Wien St. Marx
Litfaßstrasse 6
A - 1030 Wien
Tel.: 01 907 3515
Fax.: 01 907 3515 9901
E-Mail: markta049@obi.at

Öffnungszeiten: Mo-Fr 07:30 bis 19:30Uhr
Sa 07:30 bis 18:00 Uhr
Lieferdatum = Kassensondatum
DVR Nummer 08 22 795

Rechnungs-Nr.: 095710

Bon-Nr: 5710
Kasse: 09
Bediener: 22

Kundennummer: 9000
Kunden-Tel:
Kunden-Fax:
Kunden-Mobil-Tel:
Kunden-Ident-Nr.:
Erstelldatum: 20.06.2016
Verkaufsdatum: 20.06.2016
UstIdNr: ATU39090504

Rechnung / Quittung

Original

Gültig nur mit Originalbon.

01049 09 5710 0022 20.06.2016 18:34:14

4006398334956 Rasen Start-Duenger
1 PA B 14,99
4008398338862 Strapazier-Rasen
1 EI D 37,99
4007875358300 KABELBINDER
1 ST B 6,79

Endsumme in €

59,77

Bar 52,98
maestro 6,79
maestro Zahlung erfolgt!
Terminal-ID 60960509
POS-Nr 65364 Bnr 7663
PAN: #####88991
AID-Parameter
AID 894482

Die Endsumme enthält an MwSt
13,00 % MwSt D 33,62
20,00 % MwSt B 18,15 3,63

USt-IdNr.: ATU39090504

*
Vielen Dank für Ihren Einkauf!

*
Umtausch original verpackter Ware nur
mit Kassensbon innerhalb von 3 Monaten.
Vom Umtausch ausgeschlossen: Lebend-,
Zuschnittware und Sonderbestellungen

*
Jetzt zum OBI Newsletter anmelden und
Vorteile unter www.obi.at sichern!

*
Auf Wiedersehen in Ihrem OBI Markt!

Beste Kundenkarte mit bestem Service
www.obi.at
OBI - Der Lieblingsmarkt der
Selbstermacher

| | MwSt | Menge VKE | Einzelpreis € | Gesamtpreis € |
|---|------|--------------|------------------|------------------|
| 2 | | 1,000 | 14,99 | 14,99 |
| | | PA | | |
| 4 | | 1,000 | 37,99 | 37,99 |
| | | EI | | |
| 2 | | 1,000 | 6,79 | 6,79 |
| | | ST | | |

Zwischensumme: 59,77

Gesamtsumme: 59,77

Gesamtsumme MwSt: 8,00

| Netto € | MwSt-Betrag € | Brutto € |
|------------|------------------|-------------|
| 33,62 | 4,37 | 37,99 |
| 18,15 | 3,63 | 21,78 |

| Zahlungsmittel | Wert |
|---------------------|-------|
| Barzahlung | 52,98 |
| Debit-Kartenzahlung | 6,79 |

Handelsregister: FN 135421 z, Handelsgericht wien
p.h.G.
Geschäftsführung: Franz-Peter Tapaß, Jochen Ludwig, Alexander Paul, Yvonne
Bergkessel

Telefon
+43 1 907 3515-0
Telefax
+43 1 907 3515 9903

Banken
UniCredit Bank Austria AG
BLZ: 12000
Konto: 80213465313
IBAN: AT40 1200 0602 1346
5313
BIC: BKAUATWW

Seite 1 von 1
Druckdatum: 20.06.2016
gedruckt von: Kienast-Doppler
Martin

8
geprüft: CL
überwiesen:
28.06.16 ✓

Bon-ID
0 1003901612990860368



OBI Bau- und Heimwerkermarkt 039
Baumärkte A. Sochor & Co GmbH
2500 Baden, Haidhofstr. 145
UID Nr. ATU 58058103
Tel.Nr. 02252/80573, Fax 02252/44278
markta039@obi.at

Lieferscheindatum=Kassenbondatum
*

Name: _____
Ort: _____

01039 12 0130 0005 23.06.2016 17:28:04

4008398138097 Rasensamen Spiel
1 ST D 79,99

Endsumme in €
79,99

maestro 79,99
maestro Zahlung erfolgt!
Terminal-ID 55616420
POS-Nr 18800 BNr 55
PAN: #####88991
AID-Parameter
AID 612773

Die Endsumme enthält an MwSt
13,00 % MwSt D 70,79 9,20

USt-IdNr.: ATU 58058103

Vielen Dank für Ihren Einkauf!
Umtausch nur mit Kassenbon
innerhalb von 1 Monat.
Vom Umtausch ausgeschlossen:
Sonderbestellungen, Lebend- und
Zuschnittware.

Die Biber Bonus Card:
Mehr Service, mehr sparen, mehr Wert!
Sparen Sie bis zu 10% und profitieren
Sie von weiteren attraktiven Vorteilen

9
geprüft: CL
überwiesen: 28.06.16 ✓



Sportstättenbau
A-4050 Traun
Styriastraße 41
Telefon: +43 (0) 7229 / 73 3 331
Telefax: +43 (0) 7229 / 73 3 331 - 7979
E-Mail: sport@swietelsky.at
Internet: www.swietelsky.com

Dipl.-Ing. Christoph Lindner
Hummelgasse 6/6
1130 Wien

Kundennummer: 1218860
Traun, 28.06.2016
10 17 0030
Zeichen: Sch / Gut
Ihre UID.Nr.: keine vorhanden

Rechnung Nr. 171000128

Bauvorhaben: **Kinderspielplatz Traiskirchen - Vogelspielplatz**
Leistungszeitraum: 06. – 17.06.2016
Vertragsbedingungen: laut Auftrag v. 13.04.2016
Rechnungsunterlagen: Aufmaßblatt, Auftragsbestätigung, Pflegeanleitung Porplastic
Kunststoffbeläge, Stand 01/2011

| Bezeichnung | Menge EH | EH-Preis | Gesamt |
|--------------------------------|----------|------------------------|--------------------|
| Laut beiliegender Aufstellung: | | | € 26.461,77 |
| | | Nettosumme | € 26.461,77 |
| | | + 20 % MWst. | € 5.292,35 |
| | | Rechnungsbetrag | € 31.754,12 |

Zahlungsbedingung: 14 Tage – 3 % Skonto, innerhalb von 30 Tagen netto ohne Abzug

Bankverbindung: Bank Austria
IBAN AT38 1200 0006 8704 6706; BIC/SWIFT BKAUATWW

Bitte bei Zahlung im Feld "Zahlungsreferenz" die Rechnungs Nr. 171000128 eintragen

„Die nachfolgenden Buchungsvermerke gelten nur als interne Information“

| | | | | |
|---------------------|--------------------------|--------|--------------------------|----------------------------|
| Hafrücklass: | % mit einer Laufzeit von | Jahren | | |
| Ablösbar: | | | <input type="radio"/> Ja | <input type="radio"/> Nein |



Zentrale: A-4020 Linz, Edlbacherstraße 10, Tel.: + 43 (0) 732 / 69 71 - 0, Telefax: 69 71 - 7410

Bank Austria, Kto.-Nr. 687 046 706 (BLZ 12000)
IBAN AT381200 0006 8704 6706
BIC - SWIFT BKAUATWW
FN 83 175t, LG-Linz, UID.-Nr.: ATU23240400
DG-Nr.: 400050501



Bauvorhaben Kinderspielplatz Traiskirchen
 Porplastic Kunststoffbelagsarbeiten

Rechnung / EUR

| Positionsnummer | ZA Positionstext | Menge EH | Einheitspreis | Positionspreis |
|-----------------|-----------------------------------|-----------|---------------|------------------|
| 59 | Sportanlagen im Freien | | | |
| 59 39 01 A | Fallschutzbelag 40mm | 27,50 m2 | 88,23 | 2.426,33 |
| 59 39 01 C | Fallschutzbelag 80mm | 179,50 m2 | 105,15 | 18.874,43 |
| 59 39 02 A | Az Kst.Belag Farbe RAL 1015 | 27,50 m2 | 4,28 | 117,70 |
| 59 39 02 B | Az Kst.Belag Farbe RAL 1012 | 42,70 m2 | 5,20 | 222,04 |
| 59 39 02 C | Az Kst.Belag Farbe RAL 5012 | 106,80 m2 | 4,28 | 457,10 |
| 59 39 02 D | Az Kst.Belag Farbe RAL 4003 | 30,00 m2 | 7,04 | 211,20 |
| 59 39 02 E | Az Kst.Bel. Bindemittel lichtecht | 207,00 m2 | 12,79 | 2.647,53 |
| 59 45 01 A | Markieren Kst.Belag 5cm | 194,00 m | 7,76 | 1.505,44 |
| 59 | Sportanlagen im Freien | | | 26.461,77 |

Zusammenstellung (EUR)

| | | | | |
|----|------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|
| 59 | Sportanlagen im Freien | | | 26.461,77 |
| | LEISTUNGSSUMME | | | 26.461,77 |
| | | <i>Netto ohne UST</i> | <i>+ 20,00% UST</i> | <i>Brutto inkl UST</i> |
| | Summe Rechnung | 26.461,77 | 5.292,35 | 31.754,12 |

SWIETELSKY BaugesmbH

| | | | | | |
|------------------|--|-------------------------|------|------|-------------|
| Bauvorhaben | Kinderspielplatz Traiskirchen Porplastic Kunststoffbelagsarbeiten | Aufmaßblatt 0001 | | | |
| Aufmaßblatttitel | | BTCode : | LZ : | AZ : | Geprüft : N |

| Positionsnummer | Positionstext | | Ergebnis | EH |
|--|-----------------------------------|----------|----------|-----------|
| Aufmaßberechnung | | | | |
| 59 39 01 A | Fallschutzbelag 40mm | | = | |
| 27,5 | | | | 27,50 m2 |
| 59 39 01 C | Fallschutzbelag 80mm | | = | |
| 106,8+30+42,7 | | | | 179,50 m2 |
| 59 39 02 A | Az Kst.Belag Farbe RAL 1015 | | = | |
| 27,5 | | | | 27,50 m2 |
| 59 39 02 B | Az Kst.Belag Farbe RAL 1012 | | = | |
| 42,7 | | | | 42,70 m2 |
| 59 39 02 C | Az Kst.Belag Farbe RAL 5012 | | = | |
| 106,8 | | | | 106,80 m2 |
| 59 39 02 D | Az Kst.Belag Farbe RAL 4003 | | = | |
| 30 | | | | 30,00 m2 |
| 59 39 02 E | Az Kst.Bel. Bindemittel lichtecht | | = | |
| 27,5+106,8+30+42,7 | | | | 207,00 m2 |
| 59 45 01 A | Markieren Kst.Belag 5cm | | = | |
| 167 | | | | 167,00 m |
| 9*3 | | ;Ziffern | = | 27,00 m |
| Summe Position Markieren Kst.Belag 5cm | | | | 194,00 m |

| | |
|---|--|
| erstellt 29.03.2016  für den Auftragnehmer | geprüft ____ . ____ . ____ für den Auftraggeber |
|---|--|

Gedruckt mit AUER Success Version 6.00 R4 - C6461CC8-9C7C-4FF1-A27B-4E61873677F6

10

erstellt: CL

FAHRTENBUCH architektur2000.

Projekt: **Kinderspielplatz Traiskirchen**
Zweck: **ÖBA**
Fahrzeug: Opel Astra
Kennzeichen: W-37493C

| Datum | Zweck | KM Stand | | | |
|------------|----------------|----------|--------------|--------------|-------|
| | | Wien | Traiskirchen | Traiskirchen | Wien |
| 04.05.2016 | Baubesprechung | 97200 | 97227 | 97227 | 97254 |
| 13.05.2016 | ÖBA | 97706 | 97733 | 97733 | 97760 |
| 17.05.2016 | ÖBA | 97760 | 97787 | 97787 | 97814 |
| 18.05.2016 | ÖBA | 97814 | 97841 | 97841 | 97868 |
| 19.05.2016 | ÖBA | 97868 | 97895 | 97895 | 97922 |
| 20.05.2016 | ÖBA | 97922 | 97949 | 97949 | 97976 |
| 24.05.2016 | ÖBA | 97976 | 98003 | 98003 | 98030 |
| 02.06.2016 | ÖBA | 98030 | 98057 | 98057 | 98084 |
| 06.06.2016 | ÖBA | 98084 | 98111 | 98111 | 98138 |
| 07.06.2016 | ÖBA | 98138 | 98165 | 98165 | 98192 |
| 08.06.2016 | ÖBA | 98192 | 98219 | 98219 | 98246 |
| 09.06.2016 | ÖBA | 98246 | 98273 | 98273 | 98300 |
| 13.06.2016 | ÖBA | 98472 | 98499 | 98499 | 98526 |
| 14.06.2016 | ÖBA | 98526 | 98553 | 98553 | 98580 |
| 17.06.2016 | ÖBA | 98638 | 98665 | 98665 | 98692 |
| 23.06.2016 | ÖBA | 98692 | 98719 | 98719 | 98746 |
| 24.06.2016 | ÖBA | 98746 | 98773 | 98773 | 98800 |
| 27.06.2016 | Übergabe | 98874 | 98901 | 98901 | 98928 |

SUMME: 18 Fahrten a´ 54km (Wien - Traiskirchen - Wien) = 972km

0,42 cent / km (Quelle: WKO.at)

BETRAG: 972 x 0,42 = 408,24



Christoph Lindner.



TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft

11
geprüft: CL
bezahlt: 01.08.16 ✓

Business Unit 1 / Tiefbau
Niederlassung Niederösterreich
Baugebiet Pfaffstätten

LINDNER CHRISTOPH
HUMMELGASSE 6/6
1130 WIEN

16.2092 Salm/Wo/Schr RE 03183
1402981 N 07.16

Pfaffstätten, 09.08.2016

Rechnung Nr. 16/003183

Leistungszeitraum von 01.06.16 bis 30.06.16

Vogelspielplatz
Betreuungsstelle Traiskirchen
ersetzt RG 16/003124 v.18.07.2016

| Pz | Menge | Preis | |
|---------------------------|------------------------|------------|-----------------|
| 010 Kinderspielplatz TRK | | | |
| lt.beil.korr.RG 16/003124 | 1,000 PA | 2.995,57 | 2.995,57 |
| | Mehrwertsteuer | 20% AT | 599,11 |
| | Rechnungsbetrag | EUR | 3.594,68 |

| in EUR | Nettobetrag | Ust% | Ust | Bruttobetrag |
|------------------------|-------------|------|--------|--------------|
| Rechnungsbetrag | 2.995,57 | 20% | 599,11 | 3.594,68 |

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass Zahlungen mit schuldenbefreiender Wirkung ausnahmslos auf die, auf unserer Rechnung angegebenen Bankverbindung durchzuführen sind.

Fälligkeit: 14 Tage netto

PSP: 1000336015

Bei Zahlungsverzug kommen 12% p.a.zur Verrechnung

TEERAG-ASDAG AG
 Niederlassung Niederösterreich
 Baugebiet Pfaffstätten
 2511 Pfaffstätten, Josefthalerstraße 69
 Tel.: +43 (0)50 626-2465; Fax: +43 (0)50 626-2460

TEERAG-ASDAG Aktiengesellschaft
Josefsthalerstraße 69, 2511 Pfaffstätten | Tel. +43 (0)50 626 - 2465 | Fax +43 (0)50 626 - 2460
office.pfaffstaetten@teerag-asdag.at | www.teerag-asdag.at

Zentrale: Absberggasse 47, 1100 Wien, Handelsgericht Wien, FN 118596 g, UID:ATU14199302, DVR 0029327, DGNR:400061969
Erste Bank, IBAN: AT902010040312066900 | BIC: GIBAATWG

12
geprüft: CL
bezahlt: 14.08.16



Arch. Dipl.-Ing. Christoph Lindner
Architektur 2000
Hummelgasse 6
1130 Wien

RECHNUNG Nr.: 032620749
DATUM: 09.08.2016
KUNDEN-Nr.: 782229/0000

TÜV AUSTRIA
SERVICES GMBH
Krugerstraße 16
1015 Wien/Österreich
Tel: +43 (0) 1 514 07-0
Fax: DW 6005
E-Mail: services@tuv.at
http://www.tuv.at

BLATT Nr.: 1

TÜV-Auftr.Nr.: 2016-RAT-SSF-EX-0-003146

Betrifft: Leistungen des Geschäftsfeldes Infrastructure & Transportation
Abnahme der Spielgeräte in Traiskirchen, Otto-Glöckel-Straße 24 Vogelspielplatz
SPE/1066580

| Tag und Art der Leistung: | USt. | Betrag EUR |
|--|-------|------------|
| 17.06.2016 Einsatzpauschale Sponsering des Projektes "Kinderspielplatz Traiskirchen" | 20 | 99,00 |
| Summe der Positionen | | 99,00 |
| USt. 20 % von | 99,00 | 19,80 |
| Endbetrag in EUR | | 118,80 |

Prompt und ohne Abzug zahlbar.

Wir danken für die gute Zusammenarbeit.
Als Ansprechpartner steht Ihnen
Fr. BERNAS Susanne, TEL:+43 1 51407-6657, E-Mail: susanne.bernas@tuv.at
gerne zur Verfügung.

Falls Sie unser Service der elektronischen Rechnung noch nicht nutzen und Sie zukünftig Ihre Rechnung elektronisch erhalten
wollen, dann schreiben Sie uns bitte ein kurzes Email an folgende Adresse: adressenverwaltung@tuv.at

Unsere Rechnung wird mit einer elektronischen Signatur versehen und gewährleistet damit die Echtheit der Herkunft und die
Unversehrtheit des Inhalts. Diese entspricht dem Umsatzsteuergesetz (§ 11 Abs. 2 UStG)

Unserer Umwelt zuliebe.

BITTE VERWENDEN SIE FOLGENDE ZAHLUNGSREFERENZ BEI
ELECTRONIC-BANKING:032620749

Bitte bei Bezahlung Rechnungs- und Kundennummer angeben!

DVR:3002476 UID:ATU63240488

Bankverbindung:

Bank Details:
UniCredit Bank Austria AG
Raiffeisen Bank International AG
BAWAG P.S.K.
Erste Bank Österreich

Vorsitzender des Aufsichtsrats:

KR Dipl.-Ing. Johann MARIHART

Geschäftsführung:

Dipl.-Ing. Dr. Stefan HAAS
Mag. Christoph WENNINGER

IBAN:

AT131200052949001066
AT153100000104093282
AT916000000510021215
AT562011128869842600

Firmenbuchgericht/ -nummer:

Wien
FN 288476 f

Kontr.:
SBE/AKM

BIC:

BKAUATWW
RZBAATWW
BAWAATWW
GIBAAATWW

Sitz:

Krugerstraße 16
1015 Wien

Zahlbar und klagbar in Wien.

06_Fotodokumentation



































KINDERSPIELPLATZ.TRK

www.vogelspielplatz.com

Kontakt:

Christoph Lindner, Arch. DI
christoph.lindner@architektur2000.at
+43 660 84 56 0 56

Catherine Schütze, Arch. DI
catherine.schuetze@architektur2000.at

www.architektur2000.at

ARCHITEKTUR2000
